



Ti-Sourire en Haïti asbl

Rapports construction de clôture école Beraca, Haïti

19 Septembre 2017

Cher Mr GUTHMANN,

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport détaillé des différentes dépenses liées à la réalisation du projet « La Construction de la clôture de l'Ecole Beraca » pendant cet été.


Tout d'abord, mes remerciements à Dieu, à vous, aux différents donateurs, aux participants de la Tombola réalisée au profit de l'Ecole Beraca et aux femmes d'Europe qui avez contribué à la réussite de ce projet, encore merci.

Le montant disponible à la réalisation de ce projet était de 12131 dollars américains, et voici les explications des différentes étapes du projet et le tableau des différentes dépenses :

1- Explication des différentes étapes

Etape 1

Les travaux de construction ont démarré le mercredi 19 juillet 2017 avec l'implantation des ouvrages Par Mr Therne pour un montant de 3000 dollars haïtiens. Et, voici quelques images de cette première étape.

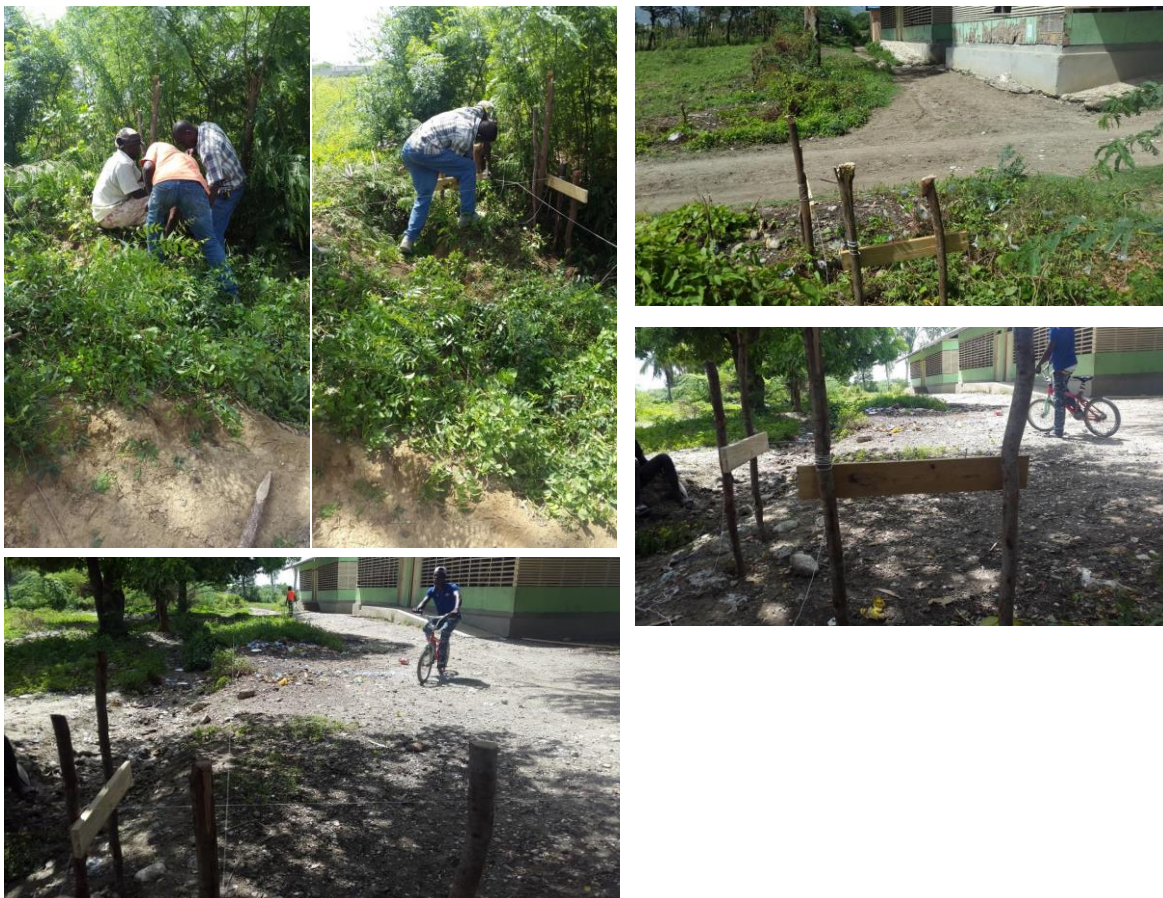

Etape 2

Les travaux de fouille de fondation (Fouille semelle et rigole de fondation), le Jeudi 20 juillet 2017 par Mr James Jean Baptiste pour un montant de 4000 dollars haïtiens.



Etape 3

Les travaux de ferraille (Semelles, Poteaux, ferraille pour chainage et ferraille ceinture supérieure) le lundi 24 juillet 2017 par Mr Luckner Pierre pour un montant de 5000 dollars haïtiens.



Etape 4

Démarrage des travaux de maçonnerie par Mr Banet Sama le Jeudi 3 août 2017 pour un montant de 10000 dollars haïtiens.

Phase 1

Placement des semelles et poteaux, béton de propreté et fongage



Phase 2

Mur élévation partie en roche



Etape 5

Ferraille pour chainage



Etape 6

Démarrage des travaux de charpente par Mr Janel Jean pour un montant de 6000 dollars haïtiens.

Coffrage semelles et ceinture chainage.



Etape 7

Deuxième partie maçonnerie (Bétonnage Semelles et ceinture chaînage).



Etape 8

Troisième partie maçonnerie (Mur élévation partie en blocs)



Etape 9

Deuxième partie charpente (coffrage des poteaux)



Etape 10

Ferraille, coffrage et bétonnage ceinture supérieure.



Etape 11

Construction achevée.



Cette construction achevée a couté 13019 dollars américains, soit 888 dollars américains de plus du montant disponible. Tableau Résumant des dépenses :

Description	Quantité	Prix unitaire	Total
Implantation d'ouvrage		3000	3000
Fouille fondation		4000	4000
Ferrailage		5000	5000
Charpente		6000	6000
Maçonnerie		10000	10000
Transport de fer	4 tonnes	1000	1000
Transport de blocs	4100	4100	4100
Roche	20 camions	800	16000
Sable moulu	2 camions	1600	3200
Graviers	3 camions	1700	5100
Sable lavé	1 camion	1800	1800
Sable blanc	10 camions	900	9000
Blocs 15	4100	6.4	26240
Location de coffrage (Planches-Bois 2X4-Laises plywood)			2450
Ciment	400 sacs	73	29200
Ciment	25 sacs	72	1800
Fil à ligaturer	2 rouleaux	750	1500
Clou 2"1/2	25 lbs	10	250
Bois 1X4X14	6	80	480
Clou 3"	17 lbs	9	153
Clou 4"	4 lbs	9	36
Clou 2"1/2	3 lbs	9	27
Ficelle	2 têtes	40	80
Clou béton 2"1/2	2 lbs	8	16
Total en dollars Haïtiens			130432
Total en dollars Américains			10519
Fer 1/2	2 tonnes	620	1240
Fer 3/8	1 tonne	620	620
Fer 1/4	1 tonne	640	640
Total général dollars américains			13019

Mr Joson AUGUSTIN Mme Marie Kendy AUGUSTIN
